

五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第三十期

（五矿信托·南沙恒大项目）

监管月报

第 18 期

（ 2022 年 6 月）

编号： 18

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间：2022 年 7 月 10 日

目 录

摘 要	- 2 -
正文	- 9 -
一、项目基本情况介绍	- 9 -
二、信托资金投入使用情况	- 13 -
三、项目证件办理情况	- 17 -
四、项目开发建设情况	- 24 -
五、重要节点进度跟踪	- 28 -
六、项目合约及成本费用执行情况	- 29 -
七、项目销售情况统计	- 34 -
八、项目银行账户情况	- 37 -
九、资金收支情况	- 38 -
十、开发贷及其他融资情况	- 43 -
十一、项目周边竞品情况分析	- 47 -
十二、区域市场情况分析	- 49 -
十三、项目公司资金计划执行情况	- 50 -
十四、项目公司用印情况	- 51 -
十五、项目公司印章证照外出情况	- 56 -
十六、项目公司签约情况	- 56 -
十七、项目整体运行情况分析	- 57 -
十八、附件	- 59 -

五矿国际信托有限公司：

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司（以下简称“恒睿公司”）、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司（以下简称“恒昌公司”）开发建设的南沙恒大文化旅游城项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为【WKHDWL2020-NeoCo-prSu-0001-00A】《委托监管合同》、【WKHDWL2020-NeoCo-prSu-0001-00B】《委托监管合同》的约定，现就本期项目董事会/股东会决议及执行情况、合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 恒睿公司：广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
- 恒昌公司：广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司

（以上公司均已纳入监管范围）

- 五矿信托：五矿国际信托有限公司
- 康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司

摘 要

1. 项目简况

项目名称	五矿信托-恒信共筑 18 号-景润西部城市更新集合资金信托计划（五矿信托·南沙恒大项目）		
业务部门	投行业务一部	项目成立日	2021 年 1 月
项目总规模（万元）	恒睿公司 105,250 恒昌公司 98,850	截至报告日已投放规模（万元）	恒睿公司：103,424 恒昌公司：97,106
合作开发商/交易对手	股权变更完毕后，原恒大集团退出，本信托计划暂未确定后续合作方		
交易结构简述	原交易结构为：（1）向恒睿公司发放信托资金合计不超过 105250 万元，其中 490 万元用于受让广州文旅持有恒睿公司的 49%股权，104760 万元用于向恒睿公司发放股东借款，具体用于南沙恒大文化旅游城项目地块一开发建设；（2）向恒昌公司发放信托资金合计不超过 98850 万元，其中 490 万元用于受让广州文旅持有恒昌公司的 49%股权，98360 万元用于向恒昌公司发放股东借款，具体用于南沙恒大文化旅游城项目地块二开发建设。后因恒大集团主体债务危机，经五矿信托及恒大集团友好协商，更改交易结构为五矿信托整体受让恒睿公司、恒昌公司全部股权（已于 2022 年 1 月 26 日完成工商变更）；五矿信托支付相应交易对价给恒大集团。（具体交易对价金额暂未披露）		
标的项目名称（案名）	广深恒大文化旅游城项目	地址	广东省广州市南沙区万顷沙镇
项目业态及面积	本项目占地面积为 291960 m ² ，总建筑面积为 761841.5 m ² ，可售面积为 601363.2 m ² ，可售比为 78.94%；其中：公寓可售面积 580621.85 m ² ，商业可售面积 20741.35 m ² ，地下车位 5268 个。		

2. 本期合同签署情况

项目本期恒睿公司签订 4 份合同，签订合同金额合计为 176.99 万元，截至本期期末项目累计签订合同金额为 173,381.11 万元。

3. 项目证照办理情况

项目已停工，本期取证停滞，未取得相关资质证书。截至本期期末，项目于 2021 年 8 月 18 日已取得 01 地块不动产权证；已经取得 01 地块、02 地块已经取得建设用地规划许可证（恒睿建设用地规划许可证于 2020 年 11 月 3 日取得，恒昌建设用地规划许可证于 2020 年 12 月 7 日取得）；01 地块建设工程规划许可证（1#办公及商业）于 2021 年 5 月 8 日取得，（2#商业）于 2021 年 4 月 23 日取得，（3#办公及商业）于 2021 年 4 月 23 日取得，

（5#办公及商业）于 2021 年 5 月 8 日取得，（6#办公及商业）于 2021 年 5 月 31 日取得，（7#商业、P1#地下室）于 2021 年 4 月 2 日取得，（8#办公及商业）于 2021 年 5 月 14 日取得，（9#办公及商业于）2021 年 5 月 21 日取得，（10#商业、12#商业）于 2021 年 4 月 23 日取得，（11#办公及商业）于 2021 年 5 月 31 日取得，（13#办公及商业）于 2021 年 4 月 23 日取得，（17#办公及商业）于 2021 年 5 月 21 日取得，（15#办公及商业）于 2021 年 6 月 21 日取得，（16#办公及商业）于 2021 年 6 月 21 日取得，（14#办公及商业）月 2021 年 7 月 27 日取得）；02 地块建设工程规划许可证（（1#游乐推广中心）于 2021 年 2 月 26 日取得，（2#游乐推广中心）于 2021 年 2 月 26 日取得，1#商业楼及酒店 1 幢于 2021 年 8 月 21 日取得，4#商业楼于 2021 年 8 月 21 日取得，5#商业楼于 2021 年 8 月 21 日取得）；01 地块施工许可证（一标段【基坑支护和土方开挖】于 2020 年 11 月 01 日取得，二标段【基坑支护和土方开挖】于 2020 年 11 月 02 日取得，一标段【地下室】于 2021 年 02 月 01 日取得，二标段【地下室】于 2021 年 02 月 01 日取得，二标段-3#办公及商业【±0.000 以上】于 2021 年 06 月 01 日取得，一标段-13#办公及商业【±0.000 以上】于 2021 年 05 月 20 日取得），02 地块施工许可证（二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】于 2020 年 12 月 23 日取得，一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】于 2021 年 01 月 19 日取得，二标段-商业示范区（1#游乐推广中心）【地下室】于 2021 年 03 月 23 日取得，一标段销售中心（2#游乐推广中心）【地下室】于 2021 年 03 月 23 日取得，二标段-商业示范区（1#游乐推广中心）【±0.000 以上】于 2021 年 04 月 05 日取得，一标段销售中心（2#游乐推广中心）【±0.000 以上】于 2021 年 04 月 05 日取得）。取得的证照已全部交接共管。

4. 项目开发成本支付情况

本期恒睿公司未支付工程款，截至本期期末五矿南沙项目项目 2020NJY-11 地块累计

完成工程量产值约 50,054.81 万元。部分工程类合同进度款支付，按双方确认工程产值，以合同约定比例（80%或 70%）支付。本项目现处于停工阶段，截至目前，所有进度款支付申请审批我司均已复核，未出现超合同进度款支付比例款项。

本期恒昌公司未支付工程款，截至本期期末五矿南沙项目 2020NJY-12 地块累计完成工程量产值约 16,251.15 万元。部分工程类合同进度款支付，按双方确认工程产值，以合同约定比例（80%或 70%）支付。

本项目现处于停工阶段，截至目前，所有进度款支付申请审批我司均已复核，未出现超合同进度款支付比例款项。

5. 销售情况

本期五矿南沙项目营销由于已暂停，施工未进行到销售阶段。

6. 资金收支及账户余额情况

本期恒睿公司本期流入资金 280,110.87 元，为各银行账户季度利息收入 3,825.39 元，九江银行账户申请政府退地款金额收入 258,660.48 元，广州银行政府一次性留工补助广州市 17,625.00 元；

本期恒睿公司资金支出现金 253,944.79 元，其中管理费用 253,302.29 元、财务费用 642.50 元；

截至本期期末恒睿公司所有账户资金余额 3,134,548.86 元，其中浦发银行及广州银行、渤海银行账户被司法冻结，受限金额为 1,742,692.68 元，可用资金 17,201.45 元。

本期恒昌公司流入资金 1,377,314.26 元，为各银行账户季度利息收入 5978.10 元，九江银行账户申请政府退地款金额收入 1,366,336.16 元，广州银行政府一次性留工补助广州市 5,000.00 元；

本期恒昌公司资金支出现金 1,377,128.87 元，为管理费用 25,565.99 元、财务费用

130.00 元、税费 1,351,432.88 元；

截至本期期末恒昌公司所有账户资金余额 7,767,844.02 元，其中浦发银行账户被司法冻结，另渤海银行账户为复垦保证金账户，受限金额合计为 7,736,370.55 元，可用资金 31,473.47 元。

7. 项目开发贷及其他融资情况

申请开发贷条件：房地产开发项目四证(国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及建筑工程施工许可证)必须齐全、房地产开发项目资本金比例应达到国家最低要求 30%，开发商或其控股股东具备房地产开发二级资质。项目公司暂不满足申请条件，无法申请开发贷。

截至本期恒昌公司累计使用商业承兑汇票方式支付工程款 52,294,728.99 元；恒睿公司累计使用商业承兑汇票方式支付工程款 168,416,562.70 元。截至本期期末两家公司累计已开出应兑付的商业承兑汇票金额为 158,871,323.40 元，本月恒昌公司商业承兑汇票到期 1,024,179.33 元，恒睿公司商业承兑汇票到期 2,174,642.56 元。

本月未兑付商票因项目公司无资金支付，暂未兑付。

8、项目监管交接情况

截至本期期末，共管资料情况如下：

本期章证照等物品均已交接特资部财务部赖正梅及行政部刘永斌二人与驻场人员共管，监管物品如下表：

监管物品	在管物品		待管物品/待落实监管事项
印章	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	公章	
		法人章（刘青）、法人章（赵玉腾）	
		财务专用章	
		合同专用章	

		收款专用章一	
		收款专用章二	
		工程部章一	
		发票专用章	
	广州南沙区恒昌文化 游发展有限公司	公章	
		法人章（赵玉腾）	
		财务专用章	
		合同专用章	
		工程部章一	
		工程部章二	
		发票专用章	
证照	广州南沙区恒睿文化 游发展有限公司	营业执照正本	
		营业执照副本 2-1	
		营业执照副本 2-2	
		准予变更登记（备案）通知书	
		基本存款账户信息	
		国有建设用地使用权出让合同	
		股权出质设立登记通知书	
		建设用地规划许可证（01 地块）	
		不动产权证（01 地块）	
		工程规划许可证（01 地块）	
		建筑工程施工许可证正本（01 地块二标段）	
		建筑工程施工许可证副本（01 地块二标段）	
		建筑工程施工许可证正本（01 地块一标段）	
		建筑工程施工许可证副本（01 地块一标段）	
	广州南沙区恒昌文化 游发展有限公司	营业执照正本	
		营业执照副本 2-1	
		营业执照副本 2-2	
		准予变更登记（备案）通知书	
		基本存款账户信息	
		国有建设用地使用权出让合同	
		股权出质设立登记通知书	
		建设用地规划许可证（02 地块）	
银行账户密钥	广州南沙区恒睿文化 游发展有限公司	账户名：浦发银行广州珠江新城支行 账号：82140078801900001647 序列号：PF16FA8002660888	
		账户名：广州银行营业部 账号：800270734609010 序列号：4111831000946	
		账户名：九江银行股份有限公司广州分行营业部	

		账号：587019200000000817 序列号：9531619000565310/9531619000565148 账户名：盛京银行股份有限公司沈阳市保工支行 账号：0332110102000015758 序列号：000000608189 账户名：中国农业银行股份有限公司广州南沙华侨农场支行 账号：44-077701040013246/44-077701040013295 序列号：535707062365	
		开户行：浦发银行广州珠江新城支行 账号：82140078801700001648 序列号：PF16FA8002660806 开户行：广州银行营业部 账号：800270738909010 序列号：4111831000950 开户行：广发银行股份有限公司广州天河东支行 账号：9550880224116500187 序列号：3510174816 账户名：盛京银行股份有限公司沈阳市保工支行 账号：0332110102000015758 序列号：000000607102	
结算业务委托书	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	开户行：浦发银行广州珠江新城支行 票据号码：3119609-31196505	
预留印鉴卡	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	浦发银行预留印鉴卡、广州银行预留印鉴卡、九江银行预留印鉴卡、盛京银行预留印鉴卡、渤海银行预留印鉴卡、农业银行预留印鉴卡；	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	浦发银行预留印鉴卡、广州银行预留印鉴卡、广发银行预留印鉴卡、盛京银行预留印鉴卡、渤海银行预留印鉴卡；	
支票	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	票据号码：32981619-32981643	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	票据号码：32981594-32981618	
保险柜钥匙	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	主钥匙 2 把	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	主钥匙 2 把	

9. 项目存在的风险情况

本期五矿南沙项目存在以下风险：①项目工程建设进度停滞，导致原定工程建设进度计划未能实现；②商品房预售许可证取证同期延后，导致项目原定销售计划未能实现；③

目前项目周边竞品项目较少，尤其公寓、商业在售项目几乎没有，市场行情无法精确研判；④项目公司未提供目标成本和合约规划，目前项目公司成本管控措施多以事后控制为主，有超对赌成本风险；⑤项目公司目前由于资金原因，现场已处于停工状态；⑥项目公司公寓业态备案价 2.5 万元/平，相对周边竞品恒大阳光半岛住宅售价 2.1 万/平、全款 1.8 万/平的价格，无论业态亦或者价格均不具有优势。⑦因未能按时兑付商业承兑汇票，项目公司已被起诉，现案件正在广州中院审理执行，部分账户已被法院冻结，恒睿公司冻结金额 78,217,565.44 元，恒昌公司暂无冻结。如后期无资金投入支付承兑汇票，相关起诉将会增多，账户无法使用，影响项目公司正常运营。⑧恒睿公司因欠缴个人所得税 77473.6 元，被国家税务局广州市南沙区税务局公告警示，后续有被罚款的风险。

（以下为正文部分）

正文

五矿信托·南沙项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

1. 项目公司各个股东的基本情况及其关联关系

截至报告期末，广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司股东总数为 1 家。股权结构为：五矿国际信托有限公司持有广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司 100% 的股权，认缴出资额 980 万元。

广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股东总数为 1 家。股权结构为：五矿国际信托有限公司持有广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司 100% 的股权，认缴出资额 980 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日股东基本情况如下表：

表一、项目公司股东基本情况表

股东名称	持股比例	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围
五矿国际信托有限公司	100%	王卓	1,305,106.90 51 万元	青海省西宁市城东区创业路 108 号南川工业园区投资服务中心 1 号楼 4 层	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；受托境外理财；法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股权穿透图如下所示：



广州南沙区恒睿文化旅游发展公司股权穿透图



广州南沙区恒昌文化旅游发展公司股权穿透图

2. 标的项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“广深国际旅游城”，广东省广州市南沙区万顷沙镇，项目四至为东至万环西路，北至 16 涌，西至洪奇沥水道，南至市政规划支路。项目用地面积 291960 平方米，用地性质为城镇住宅用地，地块容积率 2.37，总规划面积 291960 平方米，计容建筑面积 694371 平方米，可售建筑面积 594909 平方米，可售车位 5268 个，项目总货值约 105.20 亿元。

表二：项目各项经济指标

地块/属期/楼栋		对赌指标	标底项目 1	标底项目 2	总计	备注
用地面积 (m²)		291960	73459	218501	291960	
建筑面积 (m²)		761841	434765	327076	761841	
计容建筑面积 (m²)		694371	367295	327076	694371	
其中	公寓可售	580621	328825	248627	577452	
	商业可售	20741	10170	7287	17457	
	不可售面积	92881	28300	71162	99462	
不计容建筑面积 (m²)		160451	67470	0	67470	
可售车位 (个)		5268	3184	243	3427	
货值 (万元)		1052021	593458	430396	1023855	
其中	公寓	958025	542561	410235	952796	
	商业	51853	25425	18218	43643	
	车位	42144	25472	1944	27416	

(1) 存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

目前，五矿南沙项目存在问题：①工程开发建设进度滞后；②取证进度滞后；③欠付民工工资。

2) 原因

①工程进度滞后原因：前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定滞后；近期由于疫情影响和项目公司资金周转紧张及商票无法按期兑付，对项目施工进度安排也有重大影响。目前项目公司由于政策和资金原因，导致 02 地块货量区已停滞，01 地块建设进度也停滞，开盘考核节点已超监管协议宽限期最迟对赌时间节点（2021 年第二季度末，最迟不超过二个月）；

②取证进度滞后原因：2#地块土地证因未缴纳足额土地出让金暂未取得不动产权证书。前期由于建设资金紧张，现场工程进度放缓，存在由于工程形象进度达不到政府要求的拿证风险；截止目前，项目建设进度已处于停滞状态。

3) 潜在风险

①项目工程建设进度已处于停滞状态，商品房预售许可证取证同期延后，导致项目原定销售计划未能实现；②目前项目周边竞品项目较少，尤其公寓、商业在售项目几乎没有，市场行情无法研判对项目收益测算予以数据支撑；③项目公司未提供目标成本和合约规划，目前项目公司成本管控措施多以事后控制为主，有超原信托计划对赌成本风险。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

①工程进度停滞的应对措施：应积极沟通政府相关部门协调解决复工及资金紧张等问题，内部及时解决关联单位债务问题，落实建设资金来源，确保工程建设资金，做好施工单位安抚工作，为后续正常施工做准备；

②工程进度滞后的应对措施：项目公司应组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配备，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作，加快项目工程建设进度，尽快打开营销局面，加快项目销售进度，形成良性循环；

③取证进度滞后措施：督促项目公司根据开盘计划加紧相关证照手续资料准备工作，在证照原件取得之后及时放入共管保险柜里进行共管。

2) 后期需关注事项

①工程建设进度与开发协议约定节点是否匹配；②取证进度与开发协议约定节点是否匹配；③施工图图审和施工图预算能否按时间节点完成；④项目公司与政府就本项目销售政策的谈判，营销方案和定价策略的变化；⑤开盘后销售资金回款及项目整体现金流情况。目前项目公司工程建设进度和取证节点已触发模拟清算情形。

二、信托资金投入使用情况

本期恒睿公司、恒昌公司未信托投入资金。本期恒睿公司未使用资金、恒昌公司未使用资金，截至本期期末，恒睿公司信托资金累计投入 103,424.00 万元，恒昌公司信托资金累计投入 97,106.00 万元。

表三：信托资金投入使用情况

单位：元

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资	已使用金额	用途	余额
1	20201231	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	/	4,900,000.00
2	20201231	30,730,000.00	35,630,000.00	0.00	/	35,630,000.00
3	20210107	30,940,000.00	66,570,000.00	0.00	/	66,570,000.00
4	20210122	7,550,000.00	74,120,000.00	0.00	/	74,120,000.00
5	20210122	97,050,000.00	171,170,000.00	0.00	/	171,170,000.00
6	20210129	116,170,000.00	287,340,000.00	0.00	/	287,340,000.00
7	20210129	12,950,000.00	300,290,000.00	0.00	/	300,290,000.00
8	20210205	19,030,000.00	319,320,000.00	0.00	/	319,320,000.00
9	20210205	2,120,000.00	321,440,000.00	0.00	/	321,440,000.00
10	20210210	11,690,000.00	333,130,000.00	0.00	/	333,130,000.00
11	20210210	104,840,000.00	437,970,000.00	0.00	/	437,970,000.00
12	20210220	1,260,000.00	439,230,000.00	0.00	/	439,230,000.00
13	20210220	11,280,000.00	450,510,000.00	0.00	/	450,510,000.00
14	20210226	2,910,000.00	453,420,000.00	0.00	/	453,420,000.00
15	20210226	26,080,000.00	479,500,000.00	0.00	/	479,500,000.00
16	20210303	0.00	479,500,000.00	461,643,000.00	缴纳土地款	17,857,000.00
17	20210305	15,450,000.00	494,950,000.00	0.00	/	33,307,000.00
18	20210305	1,720,000.00	496,670,000.00	0.00	/	35,027,000.00
19	20210305	0.00	496,670,000.00	18,563,000.00	支付材料款	16,464,000.00
20	20210310	6,490,000.00	503,160,000.00	0.00	/	22,954,000.00
21	20210310	58,200,000.00	561,360,000.00	0.00	/	81,154,000.00
22	20210321	0.00	561,360,000.00	-553,833.63	银行付息	81,707,833.63
23	20210325	0.00	561,360,000.00	2,985,500.00	支付工程款	78,722,333.63
24	20210330	0.00	561,360,000.00	16,732,600.00	支付工程款	61,989,733.63
25	20210412	0.00	561,360,000.00	9,940,000.00	支付工程款	52,049,733.63
26	20210412	0.00	561,360,000.00	8,640,000.00	支付工程款	43,409,733.63
27	20210414	0.00	561,360,000.00	9,280,000.00	支付工程款	34,129,733.63
28	20210415	0.00	561,360,000.00	7,950,000.00	支付工程款	26,179,733.63
29	20210423	0.00	561,360,000.00	9,940,000.00	支付工程款	16,239,733.63
30	20210425	0.00	561,360,000.00	5,300,000.00	支付工程款	10,939,733.63

31	20210501	0.00	561,360,000.00	1,021.00	银行收费	10,938,712.63
32	20210514	185,640,000.00	747,000,000.00	0.00	/	196,578,712.63
33	20210514	20,690,000.00	767,690,000.00	0.00	/	217,268,712.63
34	20210520	0.00	767,690,000.00	5,030,000.00	支付工程款	212,238,712.63
35	20210521	0.00	767,690,000.00	3,040,000.00	支付工程款	209,198,712.63
36	20210521	10,840,000.00	778,530,000.00	0.00	/	220,038,712.63
37	20210521	97,280,000.00	875,810,000.00	0.00	/	317,318,712.63
38	20210524	0.00	875,810,000.00	3,180,000.00	支付工程款	314,138,712.63
39	20210528	0.00	875,810,000.00	24,270,000.00	支付工程款	289,868,712.63
40	20210601	0.00	875,810,000.00	425.00	银行收费	289,868,287.63
41	20210611	9,000,000.00	884,810,000.00	0.00	/	298,868,287.63
42	20210611	80,760,000.00	965,570,000.00	0.00	/	379,628,287.63
43	20210617	0.00	965,570,000.00	289,868,287.63	办理定期存单	89,760,000.00
44	20210618	9,750,000.00	975,320,000.00	0.00	/	99,510,000.00
45	20210618	1,090,000.00	976,410,000.00	0.00	/	100,600,000.00
46	20210618	0.00	976,410,000.00	89,760,000.00	办理定期存单	10,840,000.00
47	20210621	0.00	976,410,000.00	-588,032.72	银行付息	11,428,032.72
48	20210622	0.00	976,410,000.00	10,830,000.00	办理定期存单	598,032.72
49	20210625	5,800,000.00	982,210,000.00	0.00	/	6,398,032.72
50	20210625	52,030,000.00	1,034,240,000.00	0.00	/	58,428,032.72
51	20210630	0.00	1,034,240,000.00	57,830,000.00	办理定期存单	598,032.72
52	20210805	0.00	1,034,240,000.00	-10,833,971.00	定期存单解押	11,432,003.72
53	20210805	0.00	1,034,240,000.00	-57,847,349.00	定期存单解押	69,279,352.72
54	20210805	0.00	1,034,240,000.00	-289,986,650.51	定期存单解押	359,266,003.23
55	20210805	0.00	1,034,240,000.00	-89,795,904.00	定期存单解押	449,061,907.23
56	20210805	0.00	1,034,240,000.00	448,288,287.63	转给五矿信托 作为保证金	773,619.60
57	20210805	0.00	1,034,240,000.00	200.00	银行收费	773,419.60
58	20210816	0.00	1,034,240,000.00	-448,288,287.63	五矿信托保证 金转回	449,061,707.23
59	20210816	0.00	1,034,240,000.00	448,288,287.63	支付土地款	773,419.60
60	20210816	0.00	1,034,240,000.00	598,032.72	转出到广州银 行	175,386.88
61	20210816	0.00	1,034,240,000.00	175,386.88	转出到广州银 行	0.00
62	20220228	300,000.00	1,034,540,000.00	0.00	/	300,000.00
63	20220228	0.00	1,034,540,000.00	113,908.83	支付社保费	186,091.17
64	20220228	0.00	1,034,540,000.00	110,739.00	支付公积金	75,352.17
	合计	1,034,540,000.00	1,034,540,000.00	1,034,464,647.83		

表四：恒昌公司信托资金投入使用情况

单位：元

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资	已使用金额	用途	余额
1	20201231	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	/	4,900,000.00
2	20201231	28,870,000.00	33,770,000.00	0.00	/	33,770,000.00
3	20210107	29,060,000.00	62,830,000.00	0.00	/	62,830,000.00
4	20210122	91,150,000.00	153,980,000.00	0.00	/	153,980,000.00
5	20210122	7,050,000.00	161,030,000.00	0.00	/	161,030,000.00
6	20210129	109,100,000.00	270,130,000.00	0.00	/	270,130,000.00
7	20210129	12,080,000.00	282,210,000.00	0.00	/	282,210,000.00
8	20210205	17,870,000.00	300,080,000.00	0.00	/	300,080,000.00
9	20210205	1,980,000.00	302,060,000.00	0.00	/	302,060,000.00
10	20210210	98,470,000.00	400,530,000.00	0.00	/	400,530,000.00
11	20210210	10,900,000.00	411,430,000.00	0.00	/	411,430,000.00
12	20210220	10,590,000.00	422,020,000.00	0.00	/	422,020,000.00
13	20210220	1,170,000.00	423,190,000.00	0.00	/	423,190,000.00
14	20210226	24,500,000.00	447,690,000.00	0.00	/	447,690,000.00
15	20210226	2,710,000.00	450,400,000.00	0.00	/	450,400,000.00
16	20210303	0.00	450,400,000.00	441,090,000.00	缴纳土地款	9,310,000.00
17	20210305	0.00	450,400,000.00	4,136,000.00	支付材料款/	5,174,000.00
18	20210305	14,520,000.00	464,920,000.00	0.00	/	19,694,000.00
19	20210305	1,610,000.00	466,530,000.00	0.00	/	21,304,000.00
20	20210310	54,660,000.00	521,190,000.00	0.00	/	75,964,000.00
21	20210310	6,050,000.00	527,240,000.00	0.00	/	82,014,000.00
22	20210321	0.00	527,240,000.00	-524,054.30	银行付息	82,538,054.30
23	20210325	0.00	527,240,000.00	5,330,500.00	支付工程款	77,207,554.30
24	20210419	0.00	527,240,000.00	6,900,000.00	支付工程款	70,307,554.30
25	20210425	0.00	527,240,000.00	5,380,000.00	支付工程款	64,927,554.30
26	20210428	0.00	527,240,000.00	1,380,000.00	支付工程款	63,547,554.30
27	20210501	0.00	527,240,000.00	273.20	银行收费	63,547,281.10
28	20210511	0.00	527,240,000.00	1,380,000.00	支付工程款	62,167,281.10
29	20210514	174,360,000.00	701,600,000.00	0.00	/	236,527,281.10
30	20210514	19,310,000.00	720,910,000.00	0.00	/	255,837,281.10
31	20210518	0.00	720,910,000.00	1,380,000.00	支付工程款	254,457,281.10
32	20210521	10,120,000.00	731,030,000.00	0.00	/	264,577,281.10
33	20210521	91,360,000.00	822,390,000.00	0.00	/	355,937,281.10
34	20210524	0.00	822,390,000.00	5,900,000.00	支付工程款	350,037,281.10
35	20210601	0.00	822,390,000.00	173.20	银行收费	350,037,107.90
36	20210611	8,400,000.00	830,790,000.00	0.00	/	358,437,107.90
37	20210611	75,840,000.00	906,630,000.00	0.00	/	434,277,107.90
38	20210617	0.00	906,630,000.00	350,037,107.90	办理定期存单	84,240,000.00
39	20210618	1,010,000.00	907,640,000.00	0.00	/	85,250,000.00
40	20210618	9,150,000.00	916,790,000.00	0.00	/	94,400,000.00
41	20210618	0.00	916,790,000.00	84,240,000.00	办理定期存单	10,160,000.00

42	20210621	0.00	916,790,000.00	0.00		10,915,050.28
43	20210622	0.00	916,790,000.00	10,170,000.00	办理定期存单	745,050.28
44	20210625	5,410,000.00	922,200,000.00	0.00	/	6,155,050.28
45	20210625	48,860,000.00	971,060,000.00	0.00	/	55,015,050.28
46	20210630	0.00	971,060,000.00	54,270,000.00	办理定期存单	745,050.28
47	20210805	0.00	971,060,000.00	-54,286,281.00	定期存单解押	55,031,424.20
48	20210805	0.00	971,060,000.00	-84,273,696.00	定期存单解押	139,305,120.20
49	20210805	0.00	971,060,000.00	-330,171,873.05	定期存单解押	469,476,993.25
50	20210805	0.00	971,060,000.00	-10,173,729.00	定期存单解押	479,650,722.25
51	20210805	0.00	971,060,000.00	487,567,107.90	转给五矿信托作为 保证金	937,228.10
52	20210805	0.00	971,060,000.00	200.00	银行收费	937,028.10
53	20210816	0.00	971,060,000.00	745,050.28	转出到广州银行	191,977.82
54	20210816	0.00	971,060,000.00	191,977.82	转出到广州银行	0.00
55	20220228	300,000.00	971,360,000	0.00	/	300,000.00
56	20220228	0.00	971,360,000	19,091.85	支付社保费	280,908.15
57	20220228	0.00	971,360,000	15,940.00	支付公积金	264,968.15
	合计	971,360,000	971,360,000	484,061,978.25		/

（接下页）

三、项目证件办理情况

表五：项目五证办理情况

证照名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积 (m ²)	备注（进展及逾期原因）
国有土地使用证/不动产权证书	1、广州市不动产登记申请表 2、身份证明（详见《不动产登记中对身份证明、委托书的具体要求》） 3、不动产权籍调查成果：权籍调查表（含权属界线套图）（原件1份）；宗地图（原件2份） 4、税务部门出具的纳（免）税证明（原件1份，提供电子税票信息的免于提供纸质证明） 以下情形之一，还需要提交资料如下： 5、委托办理的：委托书（原件1份） 6、以出让方式取得的：国有建设用地使用权出让合同（含出让合同附件的规划设计条件）（复印件1份，原件核验）、建设用地规划许可证及附图（出让合同附件没有附规划设计条件的）（复印件1份，原件核验）、交地确认书（出让合同约定出让起始日期以交地时间为准的）（复印件1份，原件核验） 7、其他按要求需提供资料。	已完成	1、恒睿：2021-8-18	1、恒睿：73459	已完成
建设用地规划许可证	1、申请表 2、成交确认书 3、出让合同 4、营业执照	已完成	1、恒睿：2020-11-3 2、恒昌：2020-12-7	1、恒睿：73459 2、恒昌：218051	已完成

	5、法人身份证复印件 6、经办人身份证复印件 7、授权委托书 8、其他按要求需提供资料。				
建设工程规划许可证	1、立案申请表 2、告知承诺书（建设单位） 3、营业执照等申请人身份证明文件 4、有效的土地使用证明文件 5、放线册、办结书 6、总平面蓝图 7、其他按要求需提供资料。		1、恒睿： 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（1#办公及商业） 2021/5/8 广州恒大文化旅游城 01 地 块 项 目 （ 2# 商 业 ） 2021/4/23 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（3#办公及商业） 2021/4/23 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（5#办公及商业） 2021/5/8 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（6#办公及商业） 2021/5/31 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（7#商业、P1#地 下室）2021/4/2 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（8#办公及商业）	1、恒睿： 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（1#办公及商业） 30513.95 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（2#商业） 1550.55 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（3#办公及商业） 23517.28 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（5#办公及商业） 21295.82 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（6#办公及商业） 221328.7 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（7#商业、P1# 地下室）50.22/74217.37 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（8#办公及商业） 14935 广州恒大文化旅游城 01	18#由于酒店集团和集团设计院暂未提供楼栋设计要求，因此暂无法报规

			<p>2021/5/14</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（9#办公及商业）</p> <p>2021/5/21</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（10#商业、12#商业）</p> <p>2021/4/23</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（11#办公及商业）</p> <p>2021/5/31</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（13#办公及商业）</p> <p>2021/4/23</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（17#办公及商业）</p> <p>2021/5/21</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（15#办公及商业）</p> <p>2021/6/21</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（16#办公及商业）</p> <p>2021/6/21</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（14#办公及商业）</p> <p>2021/7/27</p>	<p>地块项目（9#办公及商业）</p> <p>17458.25</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（10#商业、12#商业）</p> <p>614.23/154.43</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（11#办公及商业）</p> <p>27510.11</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（13#办公及商业）</p> <p>19168.11</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（17#办公及商业）</p> <p>27637.64</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（15#办公及商业）</p> <p>55141.38</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（16#办公及商业）</p> <p>55101.12</p> <p>广州恒大文化旅游城 01 地块项目（14#办公及商业）</p> <p>27897.77</p> <p>2、恒昌</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>2、恒昌</p> <p>恒昌工规证（广州恒大文化旅游城 02 地块项目 1#游乐推广中心）2021-02-26</p> <p>恒昌工规证（广州恒大文化旅游城 02 地块项目 2#游乐推广中心）2021-02-26</p> <p>02 地块 1#、4#、5#工规证（承诺制）</p> <p>广州恒大文化旅游城 02 地块 1#商业楼及酒店 1 幢 2021/8/21</p> <p>广州恒大文化旅游城 02 地块 4#商业楼 2021/8/21</p> <p>广州恒大文化旅游城 02 地块 5#商业楼 2021/8/21</p>	<p>恒昌工规证（广州恒大文化旅游城 02 地块项目 1#游乐推广中心）6171.55</p> <p>恒昌工规证（广州恒大文化旅游城 02 地块项目 2#游乐推广中心）3538.79-02 地块 1#、4#、5#工规证（承诺制）</p> <p>广州恒大文化旅游城 02 地块 1#商业楼及酒店 1 幢 28317.36</p> <p>广州恒大文化旅游城 02 地块 4#商业楼 34301.79</p> <p>广州恒大文化旅游城 02 地块 5#商业楼 55167.79</p>	
施工许可证	<p>1、建筑施工许可证申请表（含资金和场地已落实说明）</p> <p>2、用地手续（用地规划许可证、不动产权证等）</p> <p>3、建设工程规划许可证及附件</p> <p>4、施工总承包单位的招标投标情况备案表、中标通知书、合同</p> <p>5、建造师（项目经理）资质证书、安全考核证书；总监理工程师资质证书；专职安全员安全生</p>		<p>1、恒睿：</p> <p>01 地块一标段【基坑支护和土方开挖】：2020-11-2001</p> <p>01 地块二标段【基坑支护和土方开挖】：2020-11-02</p> <p>01 地块一标段【地下室】2021-02-01</p>	<p>1、恒睿：</p> <p>01 地块一标段【基坑支护和土方开挖】：29114</p> <p>01 地块二标段【基坑支护和土方开挖】：44345</p> <p>01 地块一标段【地下室】37544.2</p>	

<p>产考核合格证</p> <p>6、施工图设计文件审查合格书</p> <p>7、建筑工程五方责任主体的《法定代表人授权书》、《工程质量终身责任承诺书》</p> <p>8、危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施</p> <p>9、其他按要求需提供资料。</p>			<p>01 地块二标段【地下室】 2021-02-01</p> <p>01 地块二标段-3# 办公及商业【± 0.000 以上】 2021-6-1</p> <p>01 地块一标段-13# 办公及商业【± 0.000 以上】 2021-5-20</p> <p>2、恒昌：</p> <p>02 地块二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】： 2020-12-23</p> <p>02 地块一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】 2021-01-19</p> <p>02 地块二标段-商业示范区（1# 游乐推广中心）【地下室】2021-03-23</p> <p>02 地块一标段销售中心（2# 游乐推广中心）【地下室】 2021-03-23</p> <p>02 地块二标段-商业示范区（1# 游乐推广中心）【± 0.000 以上】2021-04-5</p> <p>02 地块一标段销售中心（2# 游乐推广中心）【±0.000</p>	<p>01 地块二标段【地下室】 37544.2</p> <p>01 地块二标段-3# 办公及商业【±0.000 以上】 23517.28</p> <p>01 地块一标段-13# 办公及商业【±0.000 以上】 19168.11</p> <p>2、恒昌：</p> <p>02 地块二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】：3794.47</p> <p>02 地块一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】 2358</p> <p>02 地块二标段-商业示范区（1# 游乐推广中心）【地下室】4114.4</p> <p>02 地块一标段销售中心（2# 游乐推广中心）【地下室】：2359</p> <p>02 地块二标段-商业示范区（1# 游乐推广中心）【± 0.000 以上】6171.55</p>	
--	--	--	--	--	--

			以上】2021-4-5	02 地块一标段销售中心 (2# 游乐推广中心)【± 0.000 以上】3538.79 02 地块商业区域一标段 【基坑支护和土方开挖】 27000	
商品房预售许可证	1、企业法定代表人声明 2、商品房预售证申请表（含本次申请预售的房屋明细表） 3、项目形象进度和公建配套建设情况的说明与承诺、证明材料 4、房地产开企业资质证书 5、企业法人营业执照 6、建设工程规划许可证（含建筑功能指标明细表、建设工程报建审核书、单体（或小区）规划报建平面四至图） 7、土地权属证明（国有土地使用权出让合同和已缴纳地价款的发票、国有土地使用证及附图、建设用地批准书及附图） 8、建筑工程施工许可证 9、前期物业管理中标备案书 10、建设单位代交存首期物业专项维修资金交存凭证 11、商品房预售方案（含价格备案表、商品房预售款专用账户监管协议书） 12、拆迁补偿情况的复函（直管房、私房） 13、合作分成情况证明等 14、其他按要求需提供资料。	恒睿预计首期预售 2021-7-30，剩余批 次 2021-8-20	-	-	01 地块已完成 13#、3#楼预 测绘、资金监管协议开户工 作，待办理预售许可证

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

目前，五矿南沙文化旅游城项目存在预售证及部分楼栋施工许可证进度滞后的问题（已基本处于停工状态）。

2) 原因

1#地块预售证由于政府原因暂未取得；2#地块工程规划许可证、施工许可证因项目土地证未取得、图审进度缓慢、政府相关部门等因素暂未取得。

3) 潜在风险

（2）建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

统筹工程建设与开发取证工作安排，加快项目工程建设进度，及时取证（施工许可证及商品房预售许可证），形成良性循环。

2) 后期需关注事项

取证进度已超原开发协议约定时间节点，取证进度滞后。

四、项目开发建设情况

表六：项目开发进度计划

序号	单位工程/属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
1	01 地块 1#楼	正负零结构完成，一层墙柱绑筋	首层顶板钢筋完成	二层结构完成	停滞	（工程进度描述为正常，是最迟对赌时间节点为考核）
2	01 地块 2#楼					暂未施工
3	01 地块 3#楼	一层梁板支模完成 70%	二层顶板钢筋完成 80%	二层结构完成	停滞	
4	01 地块 5#楼	基础垫层、防水完成 60%	地下室墙柱钢筋完成 80%	地下室结构完成	停滞	
5	01 地块 6#楼	筏板钢筋 80%	地下室内架模板完成 70%，墙柱钢筋完成 80%	地下室结构完成	停滞	
6	01 地块 7#楼					暂未施工
7	01 地块 8#楼	夹层底板模板 50%	±0 结构砼浇筑	二层结构完成	停滞	
8	01 地块 9#楼	正负零钢筋 80%	首层顶板模板完成 90%	二层结构完成	停滞	

9	01 地块 10#楼					暂未施工
10	01 地块 11#楼	坑中坑砖胎膜完成	筏板钢筋绑扎完成 70%	地下室结构完成	停滞	
11	01 地块 12#楼					暂未施工
12	01 地块 13#楼	五层墙柱钢筋 50%	7 层浇筑完成		停滞	
13	01 地块 14#楼	坑中坑及降板钢筋完成	筏板结构完成	地下室结构完成	停滞	
14	01 地块 15#楼	桩头破除 40%	坑中坑开 40%	筏板完成	停滞	
15	01 地块 16#楼	桩头凿除 70%	坑中坑完成 50%	筏板完成	停滞	
16	01 地块 17#楼	正负零梁板支模完成	首层墙柱钢筋开始绑扎	二层结构完成	停滞	
17	01 地块 18#楼					暂未施工
18	P1 地下室					前期桩基单位人员不足
19	销售中心	外装：固定玻璃安装完成，开启扇安装完成 90%；外立面 A 面钣金完成，C、D 面钣金完成 85%；GRC 安装完成约 70%，外立面面漆完成 70%。内装：15 米天花彩绘完成，首层吊顶完成，天花墙面油漆完成，墙面木饰面基层安装完成，剩余上色收尾，石膏线完成，地面石材完成；后勤区湿作业完成；	达展示条件			
20	商业示范区	外装：屋面钢结构完成，外墙漆完成 90%，GRC 安装完成 60%。内装：一层 3 家商铺吊顶完成，湿作业完成，木饰面安装完成 80%，美冒天花转换层完成，3 家未施工；办公区天花完成、湿作业完成，安装基本完成，剩余面板插座；二层食堂及包房吊顶完成，湿作业完成，木饰面基层完成 50%；梦幻城彩绘完成 70%，雕塑完成 10%	1、营销外装完成； 2、淘气堡 设备安装、调试完成； 3、4 家商铺（五谷鱼粉、茶亭序、喜市多、银记）、美冒、百乐软硬装完成，肯德基未施工	商铺软硬装完成，对外开业	正常	
21	样板房	内装：4-5#室内吊顶油漆完成 60%，墙地砖完成，木饰面基层完成；门厅吊顶封板完成，腻子完成 90%，墙面干挂	达展示条件		正常	

		石材龙骨完成；6#工法馆吊顶油漆完成。外装：1-6#外墙铝板完成，幕墙玻璃完成 95%。				
22	销售中心前广场	销售中心两侧水景铺贴完成，树阵广场两侧水景铺贴完成，树阵广场树池铺贴完成，主入口 logo 水景及对称水景铺贴基本完成	达展示条件		正常	
23	儿童活动区	游乐设备安装完成 70%，排水沟施工完成 90%	达展示条件		正常	
24	展示区道路	/	达展示条件		正常	
25	沿河景观带	/	达展示条件		正常	

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

前期五矿南沙项目存在工程开发建设进度滞后的问题，截至本月项目建设进度已基本停工。

2) 原因

前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定滞后；近期由于疫情影响和项目公司资金紧张，对项目施工进度安排也有部分影响。截至本月由于政

府相关部门及集团公司和项目公司债务及资金问题，导致项目建设进度现处于停滞状态，建设施工进度已落后原计划；

3) 潜在风险

项目工程建设进度已基本停滞，致使取证与销售工作难以开展，进而影响资金回款。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

项目公司应积极协调政府相关部门，解决自身资金等一系列问题，后期组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配备，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作。

2) 后期需关注事项

工程建设进度已超开发协议约定最迟时间节点，工程建设进度已落后原计划进度

五、重要节点进度跟踪

表七：项目开发进度计划

序号	进度要求/计划	时间节点		目前完成进度情况	备注(对比节点逾期原因)
		2020NJY-11 地块	2020NJY-12 地块		
1	用地规划许可证	2021 年二季度末	2021 年四季度末	已完成 01 地块：2020 年 11 月 03 日 02 地块：2020 年 12 月 07 日	
2	不动产权证书	2021 年二季度末	2021 年四季度末	01 地块已取得	
3	工程规划许可证	2021 年二季度末	2021 年四季度末	办理中	
4	施工许可证	2021 年二季度末	2021 年四季度末	办理中	
5	开工	2020 年 10 月	2020 年 11 月	已完成	
6	首次董事会召开	/	/	/	
7	达到预售条件	2021 年二季度末	2021 年四季度末	01 地块部分楼栋达到	
8	预售证	2021 年二季度末	2021 年四季度末	暂停 01 地块办理	
9	开盘	2021 年二季度末	2021 年四季度末	/	
10	去化率满足模拟清算	/	——	/	
11	结构封顶	2022 年二季度末	2022 年四季度末	/	
12	竣工备案证	/	/	/	

13	交付证	/	/	/	
----	-----	---	---	---	--

1) 存在的问题

目前，工程开发建设进度滞后，可能导致相关节点无法按期完成。

2) 原因

前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度；目前由于政府相关部门及自身资金周转问题等原因；

（2）建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

项目公司应积极协调政府相关部门，解决自身资金等一系列问题，后期组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配备，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作。

2) 后期需关注事项

工程建设进度已超开发协议约定时间节点，工程建设进度滞后已存在触发模拟清盘情形，是否启动模拟清算，以信托要求为准

六、项目合约及成本费用执行情况

报告期间，恒睿公司签订 4 份合同，恒昌公司未签订合同；截至本期期末，恒睿公司签订合同 234 份，已签订合同总价 1,475,812,403.64 元，已支付 357,058,173.26 元，合同付款百分比为 24.89%；恒昌公司签订合同 174 份，已签订合同总价 257,998,735.07 元，已支付

97,553,169.68 元，合同付款百分比为 39.86%。

表八：广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司项目成本费用执行情况

单位：万元

序号	成本科目	本期支付(万元)	累计支付金额			已发生成本(万元)	形象进度	评价成本支出的合理性	备注
			资金付款	商票、保理等形式付款	合计				
1	土地款	0.00	169,606.68	0.00	169,606.68	169,606.68	截至本期期末，恒睿公司累计缴纳全部土地出让金 80,990.00 万元、契税 49,354,394.88 元及印花税 809,900.00 元，其他配套设施费暂未到付款。	/	
2	前期工程费	0.00	4,422.25	273.67	4,695.92	4,695.92	截至本期期末，广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司已取得除 18#栋外其他地块地规划许可证；	/	
3	房屋开发费用	0.00	18,283.19	16,391.61	34,674.80	34,674.80	本期未支出房屋开发费用；截至本期期末，广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司所持有的 13#地栋施工至 8 层，1#、3#、8#、9#、17#已出±0，5#、6#、13#、14#、15#、16#在地下室施工。	/	

4	开发间接费用	0.00	251.95	0.00	251.95	251.95	本期暂无支出开发间接费用；	/	
5	不可预见费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期暂无支出不可预见费用；	/	
6	管理费	25.33	2,973.22	0.00	2,973.22	2,973.22	本月支付管理费用包括公积金、社保等。	本月支付管理费用 25.33 万元,各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全,费用支出合理。	
7	营销费	0.00	1,037.98	176.38	1,214.36	1,214.36	/	/	
8	财务费	0.06	2,641.29	0.00	2,641.29	2,641.29	本月支付财务费用为手续费、询证函费用。	本月共支付短信服务费等 0.0642 万元,各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全,费用支出合理。	
9	合计	25.39	199,216.56	16,841.66	216,058.22	216,058.22	/	/	/

表九：广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司项目成本执行情况

序号	成本科目	本期支付 (万元)	累计支付金额			已发生金 额 (万元)	形象进度	评价成本支出的合 理性	备注
			资金付款	商票、保 理等形式 付款	合计				
1	土地费	-162.50	75,692.64	0.00	75,692.64	75,692.64	截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司已缴纳土地出让金 80,293.59 万元。 已执行退地工作，本期退款收到 1,624,996.64 元。	/	
2	前期工程费	0.00	225.29	189.00	414.29	414.29	截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的 2#地块两栋销售中心和商业展示中心的单体已经装修完成，货量区进入准备施工阶段（已暂停施工）。	/	
3	房屋开发费用	0.00	4,260.35	5,040.47	9,300.82	9,300.82	截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的 2#地块两栋销售中心和商业展示中心的单体已经装修完成，货量区进入准备施工阶段（已暂停施工）。	/	
4	开发间接费用	0.00	102.65	0.00	102.65	102.65	至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的 2#地块两栋临时用作销售中心和商业展示中心的单体已经已经装修完成，展示区园林景观带正在施工完成 95%。	/	
5	不可预见费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期暂未支出不可预见费用；	/	

6	管理费	2.56	426.23	0.00	426.23	426.23	本月支出公积金及社保费用。	本月共支付财务费用2.56万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。	
7	营销费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本月暂未支出营销费用等。	/	
8	财务费	0.01	2,502.72	0.00	2,502.72	2,502.72	本月支付财务费用为手续费；	本月共支付财务费用0.013万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。	
9	合计	-159.93	83,209.88	5,229.47	88,439.35	88,439.35	/	/	/

（1）存在的问题

五矿南沙项目恒昌公司、恒睿公司在五矿国际信托完成对标的项目的整体收购后，恒昌地块已完成退地工作，原对赌成本已不适用。

（2）建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

如后续继续开发，在梳理完毕相关成本资料后，尽快落实后续成本支出计划，作为成本管控的依据。

2) 后期需关注事项

成本规划编制的合理性、项目公司内部制度标准的执行情况以及合约规划的合理性。

七、项目销售情况统计

1. 项目推盘及去化情况

项目本期已取得不动产权证，由于政府部门原因暂无法取得预售证，不具备销售条件。

项目现阶段销售团队原为恒大童世界集团广东公司恒大阳光半岛项目抽调人手、其他地区公司支援、中介机构人员联合组成（现已退场）。项目广州城市展厅、深圳南山展厅、宝安城市展厅均已停止使用。

表十：项目销售情况

业态	项目	面积（m²）	套数（套/个）	单价（元/m²、元/个）	货值（万元）	回款(万元)	去化率（%）	月均去化面积（m²/月）	较上期回款变化(万元)
公寓	整体可售情况	580,621.00	/	15000 元/m²	870,931.50	/	——	/	——
	预售获批情况	/	/	/	/	/	——	——	——
	上期销售情况	/	/	/	/	/	——	/	——
	本期销售情况	/	/	/	/	/	——	/	/
	累计销售情况	/	/	/	/	/	/	/	——
商业	整体可售情况	20,741.00	/	25000 元/m²	518,52.50	/	——	/	——
	预售获批情况	/	/	/	/	/	——	——	——
	上期销售情况	/	/	/	/	/	——	/	——
	本期销售情况	/	/	/	/	/	——	/	/
	累计销售情况	/	/	/	/	/	/	/	——
车库	整体可售情况	/	5268	80000 元/个	421,44.00	/	——	/	——
	预售获批情况	/	/	/	/	/	——	——	——
	上期销售情况	/	/	/	/	/	——	/	——

	本期销售情况	/	/	/	/	/	——	/	/
	累计销售情况	/	/	/	/	/	/	/	——
总计	预售获批情况	/	/	/	/	/	——	——	——
	累计销售情况	/	/	/	/	/	/	/	——

(1) 存在的问题

南沙恒大项目处于南沙区万顷沙板块，暂无在售公寓竞品项目。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

加快与政府沟通。

2) 后期需关注事项

与政府沟通结果。

2. 动态货值

项目总用地面积为 291960.00 平方米，容积率 2.37；可售建筑面积 601,362.00 平方米，其中公寓建筑面积 580621.85 平方米，商业建筑面积 20741.35 平方米；不可售（配套部分）面积 93,007.80 平方米；动态总货值为 964,928.00 万元。

表十一：动态货值情况

截至 2022 年 6 月 30 日

动态货值(万元) (A) A=B+C+D	已售房屋合同额 (B) (万元)	已取得预售证的未售房屋 货值 (C) (万元) (按备案价)	未取得预售证房屋 预计货值 (D) (万元)
964,928.00	0	0	964,928.00
总可售面积 (m ²) (不计算车库)	已售面积 (m ²)	已取得预售证的未售面积 (m ²)	未取得预售证面积 (m ²)
601,362.00	0	0	601,362.00

3. 项目现金流覆盖情况

表十二：项目现金流覆盖情况

项目	金额 (万)	备注
项目账户余额	1090.24	
应收房款(已售待回)	0.00	暂未销售
项目剩余货值	964,928.00	暂未销售
项目应付款	504,485.96	
待偿还金融借款	0.00	暂无开发贷
项目现金流净额	461,532.28	
五矿与直接对手方持有项目权益占比	100%	
五矿信托存续投资本金	200,590.00	
项目现金流覆盖倍数	2.30	正常

分析：五矿已收购项目公司，已无法按原定计划按照项目销售盈利实现信托资金退出，如后续继续开发则现金流覆盖倍数为正常范围。

八、项目银行账户情况

项目公司本期暂无新开立银行账户。

截至本期期末恒睿公司所有账户资金余额 3,134,548.86 元，其中浦发银行及广州银行、渤海银行账户被司法冻结，受限金额为 1,742,692.68 元，可用资金 17,201.45 元。

至本期期末恒昌公司所有账户资金余额 7,767,844.02 元，其中浦发银行账户被司法冻结，另渤海银行账户为复垦保证金账户，受限金额合计为 7,736,370.55 元，可用资金 31,473.47 元。

表十三：广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司银行账户基本情况

序号	银行名称	账号	账户性质	是否监管	是否开通网银	截止本期余额（元）	备注
1	浦发银行（广州珠江新城支行）	82140078801900001647	基本户	是	是	1,462.06	/
2	广州银行（广州银行营业部）	800270734609010	一般户	是	是	1,373,192.67	/
3	中信银行（广州银行营业部）	8110901013001246730	信托资金放款专用账户	是	简版查询网银	15,817.72	/
4	中信银行（广州环市支行）	8110901011901298496	一般户	是	简版查询网银	17.56	
5	九江银行股份有限公司（广州分行营业部）	587019200000000817	一般户	是	是	722.04	/
6	盛京银行股份有限公司（沈阳市保工支行）	0332110102000015758	一般户	是	是	644.13	/
7	渤海银行（广州分行营业部）	2051365398000183	占用耕地复垦保证金监管账户	是	简版查询网银	1,742,692.68	/
8	中国农业银行（广州南沙华侨农场支行）	44-077701040013246	预售资金监管账户	是	简版查询网银	0.00	
9	中国农业银行（广州南沙华侨农场支行）	44-077701040013295	预售资金监管账户	是	简版查询网银	0.00	
	合计					3,134,548.86	/

表十四：广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司银行账户基本情况

序号	银行名称	账号	账户性质	是否监管	是否开通网银	截止本期余额(元)	备注
1	浦发银行（广州珠江新城支行）	82140078801700001648	基本户	是	是	210.78	
2	广州银行（广州银行营业部）	800270738909010	一般户	是	是	15,048.02	
3	中信银行（广州分行营业部）	8110901013601246704	信托资金放款专用账户	是	简版查询网银	15,333.62	
4	中信银行（广州环市支行）	8110901012601298529	一般户	是	简版查询网银	19.27	
5	广发银行股份有限公司广州天河东支行）	9550880224116500187	一般户	是	是	269.35	
6	渤海银行（广州分行营业部）	2052406609000162	占用耕地复垦保证金监管账户	是	简版查询网银	2,020,334.23	
7	渤海银行（广州分行营业部）	2052406609000281	占用耕地复垦保证金监管账户	是	简版查询网银	5,715,825.54	
8	盛京银行股份有限公司	0330150102000046063	一般户	是	是	803.21	
	合计					7,767,844.02	

九、资金收支情况

1. 资金收入

2022年6月1日-2022年6月30日期间,本期恒睿公司本期流入资金 280,110.87 元,为各银行账户季度利息收入 3,825.39 元,九江银行账户申请政府退地款金额收入 258,660.48 元,广州银行政府一次性留工补助广州市 17,625.00 元;本期恒昌公司流入资金 1,377,314.26 元,为各银行账户季度利息收入 5,978.10 元,九江银行账户申请政府退地款金额收入 1,366,336.16 元,广州银行政府一次性留工补助广州市 5,000.00 元;

表十五：恒睿公司资金收入情况

序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
1	2022/6/21	浦发银行基本户	应付活期存款息	1.13	利息	浦发银行基本户
2	2022/6/21	盛京银行	利息	1.21	利息	盛京银行一般户
3	2022/6/21	渤海银行	利息	1,335.04	利息	渤海银行监管户
4	2022/6/21	广州银行	利息	2,475.18	利息	广州银行一般户
5	2022/6/21	九江银行一般户	利息	0.58	利息	九江银行一般户
6	2022/6/21	中信银行	利息	12.12	利息	中信银行放款户
7	2022/6/21	中信银行	利息	0.01	利息	中信银行一般户
8	2022/6/30	盛京银行	利息	0.12	利息	盛京银行一般户
9	2022/6/29	广州南沙经济技术开发区商务局	2022年5月恒睿工资	174,156.05	土地款退款	九江银行一般户
10	2022/6/29	广州南沙经济技术开发区商务局	2022年5月恒睿税金	5,358.19	土地款退款	九江银行一般户
11	2022/6/29	广州南沙经济技术开发区商务局	2022年6月恒睿社保及公积金	79,146.24	土地款退款	九江银行一般户
12	2022/6/28	广州财政局	一次性留工补助广州市	17,625.00	政府补贴	广州银行一般户
合计				280,110.87		

表十六：恒昌公司资金收入情况

序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
1	2022/6/21	浦发银行	利息	0.17	/	浦发银行基本户
2	2022/6/21	广州银行	利息	38.64		广州银行一般户
3	2022/6/21	盛京银行一般户	利息	0.78		盛京银行一般户
4	2022/6/21	渤海银行监管户	利息	1,547.74		渤海银行监管户
5	2022/6/21	渤海银行监管户	利息	4,378.78		渤海银行监管户
6	2022/6/21	广发银行	利息	0.22		广发一般户
7	2022/6/21	中信银行	利息	11.75		中信银行放款户
8	2022/6/21	中信银行	利息	0.02		中信银行一般户
9	2022/6/28		一次性留工补助广州市	5,000.00		广州银行一般户
10	2022/6/29	广州南沙经济技术开发区商务局	恒昌欠缴税金及滞纳金	1,346,128.36		广州银行一般户

序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
11	2022/6/29	广州南沙经济技术开发区商务局	2022 年 5 月恒昌工资	13,938.30		广州银行一般户
12	2022/6/29	广州南沙经济技术开发区商务局	2022 年 5 月恒昌税金	195.55		广州银行一般户
13	2022/6/29	广州南沙经济技术开发区商务局	2022 年 6 月恒昌社保及公积金	6,073.95		广州银行一般户
合计				1,377,314.26		

2. 资金支出

本期恒睿公司资金支出现金 253,944.79 元，其中管理费用 253,302.29 元、财务费用 642.50 元；

本期恒昌公司资金支出现金 1,377,128.87 元，为管理费用 25,565.99 元、财务费用 130.00 元、税费 1,351,432.88 元；具体明细如下：

表十七：恒睿公司资金支出情况

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
1	2022/6/14	九江银行	收费	20.00	九江银行一般户	财务费用
2	2022/6/30	盛京银行	单位结算账户询证函	600.00	盛京银行一般户	财务费用
3	2022/6/29	李业	代发工资	24,428.12	九江银行一般户	管理费用
4	2022/6/29	莫恒榆	代发工资	12,535.37	九江银行一般户	管理费用
5	2022/6/29	孟凡凤	代发工资	16,406.69	九江银行一般户	管理费用
6	2022/6/29	王传超	代发工资	11,703.68	九江银行一般户	管理费用
7	2022/6/29	祝巍	代发工资	11,092.77	九江银行一般户	管理费用
8	2022/6/29	李伟鑫	代发工资	15,672.30	九江银行一般户	管理费用
9	2022/6/29	张飞凤	代发工资	20,737.40	九江银行一般户	管理费用
10	2022/6/29	刘永斌	代发工资	10,038.19	九江银行一般户	管理费用
11	2022/6/29	赖正梅	代发工资	8,631.45	九江银行一般户	管理费用
12	2022/6/29	陈艳玲	代发工资	5,307.82	九江银行一般户	管理费用
13	2022/6/29	刘定元	代发工资	29,239.81	九江银行一般户	管理费用
14	2022/6/29	欧云涛	代发工资	8,362.45	九江银行一般户	管理费用
15	2022/6/29	广州住房公积金管理中心	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司 2022 年 6 月份公积金	35,767.00	九江银行一般户	管理费用
16	2022/6/29	九江银行	手续费	9.00	九江银行一般户	财务费用
17	2022/6/29	九江银行	手续费	4.50	九江银行一般户	财务费用

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
18	2022/6/29	刘永斌	代缴恒睿6月份社保	43,379.24	九江银行一般户	管理费用
19	2022/6/29	九江银行	手续费	9.00	九江银行一般户	财务费用
合 计				253,944.79		

表十八：恒昌公司资金支出情况

序号		支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
1	4	2022/6/15	广州银行	对公结算账户信息资料变更	10.00	广州银行一般户	财务费用
2		2022/6/15	广州银行	账户印鉴变更（不能提供原印鉴）（对公）	100.00	广州银行一般户	财务费用
3		2022/6/20	广州市南沙行政区代理支库 192028000004278001	个税	195.55	广州银行一般户	管理费用
4		2022/6/8	广发银行	变更费用	10.00	广发银行一般户	财务费用
5		2022/6/14	广发银行	变更费用	10.00	广发银行一般户	财务费用
6		2022/6/24	刘永斌	其他合法款项—恒睿5月份个税税金	5,358.19	广州银行一般户	管理费用
7		2022/6/29	广州市南沙行政区代理支库 192028000004278001	TIPS 税（费）	1,351,432.88	广州银行一般户	税费
8		2022/6/29	金阳	工资、奖金收入	13,938.30	广州银行一般户	管理费用
9		2022/6/29	国家税务总局广州市南沙区税务局	社保费	2,713.95	广州银行一般户	管理费用
10		2022/6/29	广州住房公积金管理中心	公积金	3,360.00	广州银行一般户	管理费用
合 计					1,377,128.87		

3. 资金平衡表

表十九：恒睿公司资金平衡表

项目	项目总预算（元）	本月资金实际(元)	本年资金实际（元）	累计资金实际(截至2022.6月)（元）
经营性资金流入				
销售回款	6,366,920,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	/	0.00	0.00	0.00

经营性收入合计	6,366,920,000.00	0.00	0.00	0.00
经营性资金流出				
土地费用	1,698,210,000.00	0.00	1,371,310,790.88	1,696,066,790.88
前期费用	80,370,000.00	0.00	16,960,018.56	44,222,505.73
建安费用	1,840,710,000.00	0.00	175,473,501.98	182,831,869.81
销售费用	127,340,000.00	0.00	10,220,415.39	10,379,762.32
管理费用	73,120,000.00	253,302.29	29,218,249.04	29,732,234.99
财务费用	249,940,000.00	642.50	26,648,196.17	26,413,663.48
开发间接费用	36,810,000.00	0.00	1,809,833.92	2,519,509.26
不可预见费用	54,840,000.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00
经营性支出合计	4,161,340,000.00	253,944.79	1,632,651,005.94	1,993,176,336.47
经营性净现金流	2,205,580,000.00	-253,944.79	-1,632,651,005.94	-1,993,176,336.47
筹资性资金净现金流				
内部往来流入	/	280,122.72	1,598,295,917.13	1,996,310,885.33
内部往来流出	/	5,358.19	0.00	0.00
外部融资款流入	/	0.00	0.00	0.00
外部融资款流出	/	0.00	0.00	0.00
净现金流量		20,819.74	-34,355,088.81	3,134,548.86
期初余额		3,113,729.12	37,489,637.67	0
期末余额		3,134,548.86	3,134,548.86	3,134,548.86

表二十：恒昌公司项目资金平衡表

项目	项目总预算 (元)	本月资金实际 (元)	本年资金实际 (元)	累计资金实际(截至 2022.6月)(元)
经营性资金流入				
销售回款	4,379,620,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	/	0.00	0.00	0.00
经营性收入合计	4,379,620,000.00	0.00	0.00	0.00
经营性资金流出				
土地费用	1,588,760,000.00	0.00	454,351,438.78	758,551,438.78
前期费用	64,570,000.00	0.00	2,172,772.11	2,252,876.61
建安费用	1,569,850,000.00	0.00	42,603,521.89	42,603,521.89
销售费用	87,590,000.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	65,090,000.00	25,565.99	4,310,822.44	4,310,822.44
财务费用	236,120,000.00	130.00	25,027,252.40	25,027,252.4
开发间接费用	31,400,000.00	0.00	1,025,600.80	1,026,451.62
不可预见费用	48,820,000.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	1,351,432.88	1,639,626.24	1,639,626.24

项目	项目总预算 (元)	本月资金实际 (元)	本年资金实 际(元)	累计资金实际(截至 2022.6月)(元)
经营性支出合计	3,692,200,000.00	1,377,128.87	531,131,034.66	835,411,989.98
经营性净现金流	687,420,000.00	-1,377,128.87	-531,131,034.66	-835,411,989.98
筹资性资金净现金 流				
内部往来流入	/	1,382,684.16	992,638,202.20	1,330,746,941.90
内部往来流出	/	0.00	487,567,107.90	487,567,107.90
外部融资款流入	/	0.00	0.00	0.00
外部融资款流出	/	0.00	0.00	0.00
净现金流量		5,555.29	-26,059,940.36	7,767,844.02
期初余额		7,762,288.73	33,827,784.38	0
期末余额		7,767,844.02	7,767,844.02	7,767,844.02

十、开发贷及其他融资情况

1. 项目开发贷情况

项目公司暂不符合开发贷申请条件，本期无开发贷。

表二十一：开发贷情况表

序号	贷款银行	授信额 (亿元)	抵押物情况	贷款期限 (起始日至 到期日)	利率	期初贷 款余额 (万元)	本期提款 额(万元)	本期还 款额(万 元)	期末贷 款余额 (万元)	本月付 息金额 (万元)	累计付息金 额(万元)
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2. 其他融资情况

截至本期期末，恒睿公司累计应付其他融资余额 168,416,562.70 元，包括商业承兑汇票 168,416,562.70 元；恒昌公司累计应付其他融资余额 52,294,728.99 元，包括商业承兑汇票 52,294,728.99 元。详情如下：

表二十二：恒睿公司其他融资情况表

序号	项目	商业承兑汇票（元）	其他（元）
1	截至上期累计发生额	168,416,562.70	
2	本期新增	0.00	
3	本期到期兑付	0.00	
4	截至期末累计到期应兑付余额	120,138,596.82	
5	截至本期末累计发生额	168,416,562.70	
6	本期到期未兑付	2,174,642.56	
7	截至本期累计到期未兑付余额	120,138,596.82	
8	被监管对象应承担利息金额	0.00	
9	承担利息方式	/	
10	已付利息	0.00	
11	未付利息	0.00	

表二十三：恒昌公司其他融资情况表

序号	项目	商业承兑汇票（元）	其他（元）
1	截至上期累计发生额	52,294,728.99	
2	本期新增	0.00	
3	本期到期兑付	0.00	
4	截至期末累计到期应兑付余额	38,732,726.58	
5	截至本期末累计发生额	52,294,728.99	
6	本期到期未兑付	1,024,179.33	
7	截至本期累计到期未兑付余额	38,732,726.58	
8	被监管对象应承担利息金额	0.00	
9	承担利息方式	/	
10	已付利息	0.00	
11	未付利息	0.00	

表二十四：恒睿公司本年其他融资到期情况

序号	到期时间	本年到期金额（元）			
		商业承兑汇票	保理	其他	合计
1	2022 年 1 月	14,144,809.83	0.00	0.00	14,144,809.83
2	2022 年 2 月	15,625,000.00	0.00	0.00	15,625,000.00
3	2022 年 3 月	21,393,851.11	0.00	0.00	21,393,851.11
4	2022 年 4 月	5,649,976.05	0.00	0.00	5,649,976.05
5	2022 年 5 月	13,750,993.43	0.00	0.00	13,750,993.43
6	2022 年 6 月	2,174,642.56	0.00	0.00	2,174,642.56
7	2022 年 7 月	20,849,168.57	0.00	0.00	20,849,168.57

8	2022 年 8 月	27,428,797.31	0.00	0.00	27,428,797.31
9	2022 年 9 月	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2022 年 10 月	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2022 年 11 月	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2022 年 12 月	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年合计	121,017,238.90	0.00	0.00	121,017,238.90

表二十五：恒昌公司本年其他融资到期情况

序号	到期时间	本年到期金额（元）			
		商业承兑汇票	保理	其他	合计
1	2022 年 1 月	951,926.63	0.00	0.00	951,926.63
2	2022 年 2 月	14,490,000.00	0.00	0.00	14,490,000.00
3	2022 年 3 月	1,376,720.79	0.00	0.00	1,376,720.79
4	2022 年 4 月	7,375,576.72	0.00	0.00	7,375,576.72
5	2022 年 5 月	5,579,565.49	0.00	0.00	5,579,565.49
6	2022 年 6 月	1,024,179.33	0.00	0.00	1,024,179.33
7	2022 年 7 月	6,860,127.30	0.00	0.00	6,860,127.30
8	2022 年 8 月	6,701,875.11	0.00	0.00	6,701,875.11
9	2022 年 9 月	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2022 年 10 月	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2022 年 11 月	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2022 年 12 月	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年合计	44,359,971.37	0.00	0.00	44,359,971.37

十一、项目周边竞品情况分析

标的项目周边同类在售竞品存量不多，标的项目周边住宅类商品去化速度较快，特别是普通住宅，推盘一年内去化基本可以达到推盘量的 70%-80%；别墅类产品相对普通住宅去化速度稍慢一些；商业、商办类产品去化整体较慢，社区商业相对集中商业稍好。

价格方面，普通住宅平均售价集中在 18,000-25,000 元/平方米左右，独栋或类独栋产品价格稍高在 30,000 元/平方米左右。商办类物业多以公寓形式对外出售，平均售价价格在 16,000 元/平方米左右，底商类物业价格在 25,000 元/平方米左右，车位一般价格在 60,000-100,000 元/个。销售价格近两月基本持平。

客群方面，住宅类客群以本土客户为主，主要为改善型客户，存在少量投资性客户。

表二十六：项目周边主要竞品情况

分类	项目	占地 (亩)	体量 (万㎡)	住宅形态	面积区间 (㎡)	成交（或拟定）均 价（元/㎡）	本期去化 (套)	月均去 化（套）	总去化 量（套）	存量 (套)	营销策略
在售	恒大阳光半岛	345	65	住宅、商业（未 售）、公寓（未 开售）	72-101	高层 23933	8	99	3001	476	
在售	中国铁建海悦 国际	82.5	24.4	住宅	81-130	高层 22947	10	33	986	310	
本月 动态		1.本月恒大阳光半岛项目去化情况降低，本月中国铁建海悦国际项目去化较上月减少 20 套，销售均价较上期下降 1476 元/m2； 2.恒大阳光半岛项目 2022 年 6 月当月去化住宅 10 套，中国铁建海悦国际项目去化住宅 10 套； 3.恒大阳光半岛项目公寓商业地块暂未开售，本项目预期售价尚无数据支撑。									



十二、区域市场情况分析

1. 客群情况分析

目前，已暂停拓客、蓄客相关工作。

2. 政策分析

目前，项目所在地广州市近期政策无变动。

3. 同业态售房成交量分析

五矿南沙项目处于南沙区万顷沙板块，暂无在售公寓竞品项目。

4. 土地成交量分析

本期项目周边南沙区珠江街一涌西侧有一地块成交，地块编号：2022NJY-1，住宅用地（二类居住用地），建筑用地面积 64438 m²，规划建筑面积 225533 m²，成交价 156100 万元，成交楼面价 6921 元/m²，受让单位：广州南投房地产开发有限公司，竞得人须在用地范围内配建 22000 平方米安置房（住宅，以不动产权证书登记的建筑面积为准），由南沙开发区管委会指定单位按 3500 元/平方米的价格回购。。

5. 其他

暂无

十三、项目公司资金计划执行情况

表二十七：本期资金计划执行情况

资金类别	资金计划申请金额（元）	资金计划执行金额（元）	月度计划资金使用率	备注
工程费用	750,916.00	0.00	0.00%	/
营销费用	5,001,956.67	0.00	0.00%	/
开发费用	607,141.20	0.00	0.00%	/
管理费用	3,500,100.00	278,868.28	7.97%	/
财务费用及税费	27,111.98	1,631,846.16	6018.91%	/
不可预见性费用	0.00	0.00	0.00%	/
成本外支出	0.00	0.00	0.00%	/
合计	9,887,225.85	1,910,714.44	19.33%	

十四、项目公司用印情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表；监管人员审查项目公司内部审批流程，盖章内容与审批事由的关联性和一致性，并按监管协议权限要求发起一般事项审批单流程，完成报审后，双方监印人监管用印情况，并按要求制作相关印章使用台账；本期项目公司用印情况如下表：

表二十八：2022 年 6 月印章使用情况表

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
1	2022/6/16	恒睿	公章、法人章	广州南沙项目造价咨询服务合同	广州南沙项目造价咨询服务合同（7 份）	成本合约部	欧云涛	吴文龙
2	2022/6/16	恒睿	公章	关于要求中铁城建、中铁五局总包组织撤场的函	关于要求中铁城建、中铁五局总包组织撤场的函（各 1 份）	工程部	王传超	张佐
3	2022/6/16	恒睿	公章、法人章	关于云印公司与恒睿结算协议用印的申请	关于云印公司与恒睿结算协议用印的申请（2 份）	营销部	张飞风	张佐
4	2022/6/16	恒睿	公章、法人章	关于广硕公司与恒睿结算协议用印的申请	关于广硕公司与恒睿结算协议用印的申请（2 份）	营销部	张飞风	张佐
5	2022/6/16	恒睿	公章、法人章	关于大龙公司与恒睿结算协议用印的申请	关于大龙公司与恒睿结算协议用印的申请（2 份）	营销部	张飞风	张佐

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
6	2022/6/24	恒睿	公章、法人章	关于百纳莎臣公司与恒睿结算协议用印的申请	关于百纳莎臣公司与恒睿结算协议用印的申请（4份）	营销部	张飞凤	张佐
7	2022/6/24	恒睿	公章、法人章	关于定格公司与恒睿结算协议用印的申请	关于定格公司与恒睿结算协议用印的申请（4份）	营销部	张飞凤	张佐
8	2022/6/24	恒睿	公章、法人章	关于映前文化公司与恒睿结算协议用印的申请	关于映前文化公司与恒睿结算协议用印的申请（4份）	营销部	张飞凤	张佐
9	2022/6/24	恒睿	公章、法人章	关于盈联公司与恒睿结算协议用印的申请	关于盈联公司与恒睿结算协议用印的申请（4份）	营销部	张飞凤	张佐
10	2022/6/24	恒睿	公章、法人章	关于墨浓公司与恒睿结算协议用印的申请	关于墨浓公司与恒睿结算协议用印的申请（4份）	营销部	张飞凤	张佐
11	2022/6/24	恒睿	公章、法人章	关于峰韵服装公司与恒睿结算协议用印的申请	关于峰韵服装公司与恒睿结算协议用印的申请（4份）	营销部	张飞凤	张佐
12	2022/6/27	恒睿	公章	关于柴油发电机采购安装合同用印的申请	柴油发电机采购安装合同（4份）	成本合约部	欧云涛	张佐
13	2022/6/28	恒睿	公章	南沙项目二地块裸土覆网合同用印的申请	南沙项目二地块裸土覆网合同（4份）	成本合约部	欧云涛	张佐

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
14	2022/6/29	恒睿、恒昌	公章	南沙项目申请使用维稳专户支付南沙项目工人工资的函用印的申请	南沙项目申请使用维稳专户支付南沙项目工人工资的函件（4份）	工程部	金阳	张佐
15	2022/6/29	恒睿	公章、法人章	关于陈宇辉案起诉状及新增授权委托人相关资料用印的请示	陈宇辉授权委托书（4份）	综合管理部	刘永斌	张佐
16	2022/6/29	恒睿	公章	关于陈宇辉案起诉状及新增授权委托人相关资料用印的请示	恒睿营业执照副本、仲裁裁决书、送达证明、刘永斌身份证复印件及劳动合同复印件、法人代表身份证明及身份证复印件（各2份）	综合管理部	刘永斌	张佐
17	2022/6/29	恒睿	公章	关于陈宇辉案起诉状及新增授权委托人相关资料用印的请示	起诉状-陈宇辉案（3份）	综合管理部	刘永斌	张佐
18	2022/6/29	恒睿	公章	关于恒睿公司与安徽项美纠纷案授权材料用印的请示	安徽项美纠纷案授权委托书、恒睿营业执照副本、法人代表身份证明及身份证复印件（各2份）	综合管理部	刘永斌	张佐
19	2022/6/29	恒睿	公章	关于恒睿公司与贵阳花溪兴隆纠纷案授权材料用印的请示	贵阳花溪兴隆纠纷案授权委托书、恒睿营业执照副本、法人代表身份证明及身份证复印件（各2份）	综合管理部	刘永斌	张佐
20	2022/6/29	恒昌	公章	关于恒昌公司与深圳火狐纠纷案授权材料用印的请示	深圳火狐纠纷案授权委托书、恒昌营业执照副本、法人代表身份证明及身份证复印件（各2份）	综合管理部	刘永斌	张佐
21	2022/6/6	恒睿	公章	恒睿专项审计用印	专项审计事务约定书（4份）	财务部	李伟鑫	温家鑫

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
22	2022/6/6	恒睿	公章	领取恒大交接凭证	单位委托授权书（1份）	财务部	陈艳玲	温家鑫
23	2022/6/6	恒昌	公章	领取恒大交接凭证	单位委托授权书（1份）	财务部	陈艳玲	温家鑫
24	2022/6/10	恒睿	公章法人章	申请恒大连贵舒用印	情况说明（1份）	财务部	陈艳玲	温家鑫
25	2022/6/10	恒昌	公章法人章	申请恒大连贵舒用印	情况说明（1份）	财务部	陈艳玲	温家鑫
26	2022/6/12	恒睿	公章法人章	中行账户未经法人授权不得激活的声明	声明（1份）	财务部	陈艳玲	史震远
27	2022/6/12	恒睿	公章	申请中铁二建诉讼保全撤销	声明（1份）	财务部	陈艳玲	史震远
28	2022/6/14	恒睿	公章法人章	恒睿变更公积金账户信息及公积金线下清缴	住房公积金单位信息变更登记表（1份）、授权委托书（1份）、2022年5月单位住房公积金汇缴书（1份）、2022年6月单位住房公积金汇缴书（1份）	行政部	刘永斌	史震远
29	2022/6/16	恒睿	公章	申请维稳资金支付款项函件	申请支付项目公司日常运营费用及前期开发建设类相关费用的函（1份）	开发部	李伟鑫	史震远

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
30	2022/6/16	恒昌	公章	申请维稳资金支付款项函件	申请支付项目公司日常运营费用及前期开发建设类相关费用的函（1份）	开发部	李伟鑫	史震远
31	2022/6/29	恒睿	公章	九江银行网上电子回单	办理恒睿线下汇缴公积金（补资料）（1份）	财务部	赖正梅	温家鑫
32	2022/6/29	恒睿	公章财务章 法人章	农行询证函补资料	农行询证函补资料（2份）	财务部	陈艳玲	温家鑫

表二十九：本月项目公司印章使用情况统计表

印章类别	用印文件份数	用印章数	备注
公章	39	164	/
合同章	0	0	/
财务专用章	2	2	/
法人名章	22	57	/
工程技术章	0	0	/
发票章	0	0	/
合计	20	195	/

十五、项目公司印章证照外出情况

本期项目公司外借印章证照如下表：

表三十：本月项目公司印章证照外借情况统计表

外借日期	借用印章 证照事由	借用印章 证照名称	是否用印	用印文件	申请 部门	经办 人	陪同共 管人员	归还日期	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

十六、项目公司签约情况

2022 年 6 月期间，签订合同 4 份，详见合同签订情况表：

表三十一：2022 年 6 月合同签订情况表

序号	签约主 体	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
1	广州南沙 区恒睿文 化旅游发 展有限公 司	广州万新市场管理有限公 司	临时用地协议（170 亩）	临时用地协议（170 亩）	144,282.40	2021/6/4
2	广州南沙 区恒睿文	湖北武汉中欣工程造价咨 询有限责任公司	广州南沙项目造价咨询服务合同	委托乙方进行广州南沙项目 造价咨询的有关事项	1,490,000.00	2022/6/16

序号	签约主体	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
	化旅游发展有限公司					
3	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	广东玉电电力设备有限公司	柴油发电机采购安装合同	甲方向乙方采购柴油发动机供货及安装事项	25,000.00	2022/6/27
4	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	广州市惠丰建设有限公司	南沙项目二地块裸土覆网合同	委托乙方对二地块相关区域内进行场地平整（土方平整、建筑垃圾场地内处理），裸土处覆盖绿网满足广州防尘相关要求。	110,646.72	2022/6/28
				本期合计签订金额	1,769,929.12	

十七、项目整体运行情况分析

1. 项目开发建设情况评价

2022 年 1 月 26 日项目公司完成股权转让，现项目公司由五矿国际信托有限公司 100%控股。2022 年 3 月，由五矿国际信托有限公司特资部着手项目公司实体化运营组织架构搭建及项目公司建章建制相关工作。

截至 2022 年 4 月 30 日，工程建设进度已处于停工状态。前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定程度滞后，由于近期由于疫情影响和项目公司资金紧张，对项目施工进度安排也有部分影响。目前项目公司预售证办理及开发建设工程进度已超原计划规划取证节点。

2. 项目销售情况评价

五矿南沙项目由于政府相关部门及项目公司自身资金等诸多因素，截止本期末，营销工作现处于停滞状态。项目广州城市展厅、深圳南山、宝安城市展厅均已停止使用，但营销团队已停止拓客、蓄客工作。本期项目营销工作也已停滞。

3. 资金（成本）使用评价

本期恒睿公司账户支出 253,944.79 元，恒昌公司账户支出 1,377,128.87 元。本期项目支出主要为工资、社保、个税、财务费用等费用；个税、社保为国家税务自动划扣，划扣金额与员工工资表显示代扣金额一致相关管理费用报销付款流程齐全，付款事项与流程显示一致；网银手续费用与银行扣费标准一致；本期资金（成本）使用评价：本期项目公司资金（成本）支出合理。

4. 操作风险评价

无。

5. 其他

暂无

十八、附件

附件一：银行账户流水

附件二：合同统计表和合同付款台账

附件三：项目销售回款统计表

附件四：项目形象进度表及照片

附件五：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

① 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司余额截屏

浦发银行

SPO BANK

公司金融

Corporate Banking

找不到菜单？试试模糊搜索。

李丽

通用版

合作平台

安全退出

首页

网银管理

余额及明细

回单账单

转账支付

代发和报销

银企对账

票据业务

其他常用财务

财富管理

集团业务

跨境业务

贸易金融

电子商务

同业市场

分行特色

小企业专属

活期存款余额查询结果信息

活期存款余额查询

账户明细查询

账户历史余额查询

基本存款账户信息查询

| 人民币

总额 1,462.06

共 1 个账户

收起

企业账号	户名	分类昵称	币种/钞汇标志	可用余额	当前余额	利多多通知存款B方案余额	操作
82140078801900001647	广州南沙区恒香文化旅游发展有限公司	点击设置	人民币	0.00	1,462.06		查看详情

下载

打印

备注：

1、点击账号，显示该账号当日交易的明细信息,点击余额链接，显示每笔利多多通知存款的明细信息。

2、维护“分类昵称”请开通我行公司网银专业版，且以管理员身份进行操作。

3、我行已推出“公司手机银行查询版”服务，您可使用“公司手机银行”菜单下的“[查询版签约管理](#)”服务自助开通服务。

广州银行

BANK OF GUANGZHOU

企业网上银行

请输入关键字进行查询

菜单搜索

账户管理

投资理财

结算业务

企业管理台

客户服务

账务查询

凭证中心

账户别名设置

跨行账户管理

=快捷菜单=

朱凯迪

您上次登录的时间为:
2022-06-30 17:07:16
证书有效期: 2023-04-01

待处理业务(0)

菜单列表

- 账户信息查询
- 账户明细查询


账户管理 > 账务查询 > 账户信息查询

账号	账户名	账户别名	币种	余额	账户状态	限制类型	操作
活期账户							
800270734608010	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司		人民币	1,373,192.67	正常	部分冻结-金额冻结	明细

! 温馨提示:

*专业版下挂活期账户须激活后才能进行转账和其他交易。

- 60 -



九江银行股份有限公司（广州分行营业部）



盛京银行股份有限公司

账户余额及交易明细查询

查询条件

账户类型: 全部

*账户: 8110901013001246730/广州南沙区恒春文化旅...

账户定位:

余额查询

选择日期: ☐ 当日 ☐ 本周 ☐ 本月 ☐ 上月 ☒ 其他

起始日期: 2022-04-01

截止日期: 2022-06-24

最小金额: 0.00

最大金额: 9,999,999,999,999.99

对方账号:

对方账户名称:

查询 重置

全部下载 打印 共1条记录 << < 1 > >> 共1页 到第 页 确定

查询结果									
借方总金额: 0.00 贷方总金额: 12.12 借方总笔数: 0 贷方总笔数: 1									
交易日期	柜员交易号	摘要	附言	对方账号	对方账户名称	现转标志	付款发生额	收款发生额	余额
20220621	BEBA3441973723	批量结息入账	批量结息			转账	0.00	12.12	15,817.72

中信银行广州分行

账户余额及交易明细查询

查询条件

账户类型: 全部

*账户: 8110901011901298496/广州南沙区恒春文化旅...

账户定位:

余额查询

选择日期: ☐ 当日 ☐ 本周 ☐ 本月 ☐ 上月 ☒ 其他

起始日期: 2022-04-01

截止日期: 2022-06-24

最小金额: 0.00

最大金额: 9,999,999,999,999.99

对方账号:

对方账户名称:

查询 重置

全部下载 打印 共1条记录 << < 1 > >> 共1页 到第 页 确定

查询结果									
借方总金额: 0.00 贷方总金额: 0.01 借方总笔数: 0 贷方总笔数: 1									
交易日期	柜员交易号	摘要	附言	对方账号	对方账户名称	现转标志	付款发生额	收款发生额	余额
20220621	BEBA3441972788	批量结息入账	批量结息			转账	0.00	0.01	17.56

1. 交易明细下载必须在9900条内, 否则不能下载。

中信银行广州环市支行

渤海银行

CHINA BOHAI BANK

企业网上银行

客服电话

95541

[首页](#)
[查询服务](#)
[电子对账](#)
[电子回单](#)
[存款增值服务](#)
[结构性存款](#)
[客户服务](#)

快捷菜单

最新公告:

[企业网银公告](#)
[公告信息](#)
[企业网银公告](#)
[降低小微企业和个体工商户支付手续费的通告](#)
[关于P](#)

查询服务

• 账户余额查询

• 账户明细查询

• 定活易账户查询

• 贷款信息查询

• 保证金存款查询

• 渤海鑫查询

当前位置: 查询服务> 账户余额查询

账户余额查询

操作员: 999

广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司

选中	账号	账号类型	币种	当前余额(元)	可用余额(元)	账户状态	是否质押
<input type="radio"/>	2051365398000183	活期	人民币	1,742,692.68	0.00	正常	否

账户信息

当日明细

2014 渤海银行版权所有

客服电话: 95541

本网站支持IPv6协议

渤海银行（广州分行营业部）

[返回首页](#)

A+ 放大屏幕

[兴农商城](#)
[e管家](#)

产品/功能搜索

Q

[商户收单](#)
[爱心捐款](#)
[安全退出](#)

中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

[设置](#)
[账户](#)
[付款](#)
[存款](#)
[复核发送](#)
[服务中心](#)

[账户余额查询](#)
[账户明细查询](#)
[网上交易查询](#)
[电子回单](#)
[银企对账](#)

您现在的位置: 账户 > 账户余额查询

客户号: 44989144604 操作员号: 0001

账户余额信息

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作
1	44-077701040013246	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	支票户	人民币	0.00	0.00	账户明细
2	44-077701040013295	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	支票户	人民币	0.00	0.00	账户明细
3	44-077701040013469	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	支票户	人民币	0.00	0.00	账户明细
4	44-077701040013477	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	支票户	人民币	0.00	0.00	账户明细
5	44-077701040013485	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	支票户	人民币	0.00	0.00	账户明细
6	44-077701040013493	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	支票户	人民币	0.00	0.00	账户明细
人民币类账户余额汇总				人民币	0.00	0.00	

打印

下载

返回

关闭

帮助和其他

1. 选择“账户明细”，可对选择账户进行明细查询。

中国农业银行（广州珠江华侨农场支行）

- 63 -

② 广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司余额截屏

浦发银行 公司金融 SPDBANK Corporate Banking

找不到菜单？试试模糊搜索。

首页

活期存款余额查询结果信息

活期存款余额查询 账户明细查询 账户历史余额查询 基本存款账户信息查询

人民币 总额 210.78 共1个账户 收起

企业账号	户名	分类名称	币种/钞汇标志	可用余额	当前余额	利多通知存款B方案余额	操作
82140078801700001648	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	点击设置	人民币	0.00	210.78		查看详情

下载 打印

备注:

1. 点击账号, 显示该账号当日交易的明细信息; 点击余额链接, 显示每笔利多通知存款的明细信息。
2. 维护“分类名称”请开通我行公司网银专业版, 且以管理员身份进行操作。
3. 我行已推出“公司手机银行查询版”服务, 您可使用“公司手机银行”菜单下的“查询版签约管理”服务自助开通服务。

浦发银行（广州珠江新城支行）

广州银行 BANK OF GUANGZHOU 企业网上银行

请输入关键字进行查询 菜单搜索

账户管理 投资理财 结算业务 企业管治台 客户服务

账务查询 凭证中心 账户别名设置 跨行账户管理 =快捷菜单=

李志杰

您上次登录的时间为: 2022-06-30 16:54:29
证书有效期: 2022-12-25

待处理业务(0)

菜单列表

- 账户信息查询
- 账户明细查询


账户管理 > 账务查询 > 账户信息查询

账号	账户名	账户别名	币种	余额	账户状态	限制类型	操作
活期账户							
800270738909010	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司		人民币	15,048.02	正常	正常	明细


温馨提示:

专业版下挂活期账户须激活后才能进行转账和其他交易。

广州银行（广州银行营业）



盛京银行（沈阳市保工支行）



广发银行股份有限公司广州天河东支行

中信银行
CHINA CITIC BANK

电子对账

字体设置
在线客服
中文
帮助
安全退出

首页
批量文件下载
账户余额及交易明细查询
明细账单查询打印
余额对账回签
电子回单箱

账户余额及交易明细查询

查询条件

账户类型: 全部

*账户: 8110901013601246704/广州南沙区恒昌文化旅...

账户定位:

余额查询

选择日期:
 ☐ 当日
 ☐ 本周
 ☐ 本月
 ☐ 上月
 ☒ 其他

起始日期: 2022-04-01

截止日期: 2022-06-24

最小金额: 0.00

最大金额: 9,999,999,999,999.99

对方账号:

对方账户名称:

查询

重置

全部下载
 打印

共1条记录

共1页 到第 页 确定

查询结果

借方总金额: 0.00 贷方总金额: 11.75 借方总笔数: 0 贷方总笔数: 1

交易日期	柜员交易号	摘要	附言	对方账号	对方账户名称	现转标志	付款发生额	收款发生额	余额
20220621	BE663556266885	批量结息入账	批量结息			转账	0.00	11.75	15,333.62

中信银行广州分行

中信银行
CHINA CITIC BANK

电子对账

字体设置
在线客服
中文
帮助
安全退出

首页
批量文件下载
账户余额及交易明细查询
明细账单查询打印
余额对账回签
电子回单箱

账户余额及交易明细查询

查询条件

账户类型: 全部

*账户: 8110901012601298529/广州南沙区恒昌文化旅...

账户定位:

余额查询

选择日期:
 ☐ 当日
 ☐ 本周
 ☐ 本月
 ☐ 上月
 ☒ 其他

起始日期: 2022-04-01

截止日期: 2022-06-24

最小金额: 0.00

最大金额: 9,999,999,999,999.99

对方账号:

对方账户名称:

查询

重置

全部下载
 打印

共1条记录

共1页 到第 页 确定

查询结果

借方总金额: 0.00 贷方总金额: 0.02 借方总笔数: 0 贷方总笔数: 1

交易日期	柜员交易号	摘要	附言	对方账号	对方账户名称	现转标志	付款发生额	收款发生额	余额
20220621	BE703486697227	批量结息入账	批量结息			转账	0.00	0.02	19.27

中信银行（广州环市支行）

最新公告:

[企业网银公告](#)
[公告信息](#)
[企业网银公告](#)
[降低小](#)

查询服务

- 账户余额查询
- 账户明细查询
- 定活易账户查询
- 贷款信息查询
- 保证金存款查询
- 渤赢鑫查询

当前位置: 查询服务 > 账户余额查询

账户余额查询

操作员: 999

广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司

选中	账号	账号类型	币种	当前余额(元)	可用余额(元)	账户状态	是否有质押
<input type="radio"/>	2052406609000162	活期	人民币	2,020,334.23	2,020,334.23	正常	否
<input type="radio"/>	2052406609000281	活期	人民币	5,715,825.54	5,715,825.54	正常	否

账户信息

当日明细

渤海银行（广州分行营业部）

附件二：合同付款台账

表三十三：本期合同付款统计表

序号	对方单位	所属公司	合同文件名称	合同金额 (元)	本期付款金 额	累计付款金 额	累计已付款比 例
1	/	/	/	/	/	/	/
合计				/	0.00	0.00	

附件三：项目销售回款统计表

本期项目暂无销售回款

附件四：项目形象进度表及照片

表三十四：项目形象进度表

序号	楼栋号	业态	建筑面积 (万㎡)	形象进度	本期完成情况	工期 情况	是否满足预 售节点	质量	安全	备注
1	1#楼	loft/22F	3.022	二层顶板钢筋 90%	二层顶板钢筋 90%	停滞	否	正常	正常	
2	2#楼	商业/2F	0.154							
3	3#楼	loft/17F	2.331	二层顶板钢筋完成 80%	二层顶板钢筋完成 80%	停滞	是	正常	正常	
4	5#楼	loft/17F	2.107	地下室墙柱钢筋完 成 80%	地下室墙柱钢筋完成 80%	停滞	否	正常	正常	
5	6#楼	loft/17F	2.113	地下室内架模板完 成 70%，墙柱钢筋完 成 80%	地下室内架模板完成 70%，墙 柱钢筋完成 80%	停滞	否	正常	正常	
6	7#楼	商业/1F	0.005							
7	8#楼	平层/16F	1.480	±0 结构砼浇筑	±0 结构砼浇筑	停滞	否	正常	正常	
8	9#楼	平层/24F	1.735	首层顶板模板完成 90%	首层顶板模板完成 90%	停滞	否	正常	正常	
9	10#楼	商业/2F	0.061							
10	11#楼	loft/22F	2.724	筏板钢筋绑扎完成 70%	筏板钢筋绑扎完成 70%	停滞	否	正常	正常	
11	12#楼	商业/2F	0.015							
12	13#楼	平层/31F	1.864	7 层浇筑完成	7 层浇筑完成	停滞	是	正常	正常	
13	14#楼	loft/22F	2.760	筏板结构完成	筏板结构完成	停滞	否	正常	正常	
14	15#楼	平层/45F	5.520	坑中坑开 40%	坑中坑开 40%	停滞	否	正常	正常	


序号	楼栋号	业态	建筑面积 (万㎡)	形象进度	本期完成情况	工期 情况	是否满足预 售节点	质量	安全	备注
15	16#楼	平层/45F	5.520	坑中坑完成 45%	坑中坑完成 45%	停滞	否	正常	正常	
16	17#楼	loft/22F	2.730	首层墙柱钢筋开始 绑扎	首层墙柱钢筋开始绑扎	停滞	否	正常	正常	
17	18#楼	酒店	2.830							
18	P1 地下室	车库及设备用 房	6.904					正常	正常	
19	销售中心	1#游乐推广中 心/2F	0.354					正常	正常	
20	商业示范 区	2#游乐推广中 心/2F	0.569		1、营销外装完成； 2、淘气堡设备安装、调试完 成； 3、4 家商铺（五谷鱼粉、茶亭 序、喜市多、银记）、美冒软 硬装完成，百乐硬装完成，肯 德基未施工			正常	正常	
21	样板房	-	-	装修施工	达展示条件			正常	正常	
22	销售中心 前广场	-	-	达展示条件				正常	正常	
23	儿童活动 区	-	-	达展示条件				正常	正常	
24	园林景观 区（包含 沿河景观 带）	-	-	达展示条件	达展示条件			正常	正常	
25	规划市政 道路	-	-	达展示条件	达展示条件			正常	正常	

序号	楼栋号	业态	建筑面积 (万㎡)	形象进度	本期完成情况	工期 情况	是否满足预 售节点	质量	安全	备注
项目 整体 评价	截至 2022 年 6 月 30 日，项目现场开发进度只有少数部分楼栋达到政府部门预售要求的进度节点。原信托监管协议约定的开盘考核节点为 2021 年二季度末（宽限期不超过两个月），项目公司目前由于政府部门及自身资金等原因，建设进度现处于停工状态，已超原计划节点。									

截至本期期末，现场形象进度照片如下：



营销围挡

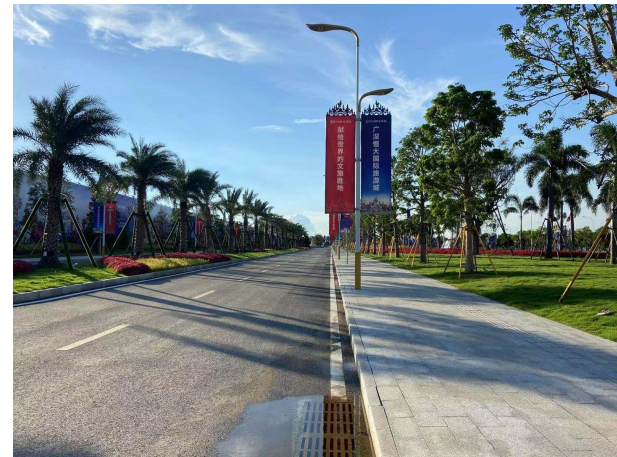

平行万还西路展示路



展示道路雕塑



展示道路雕塑




展示道路绿化



精神堡垒



洪江路

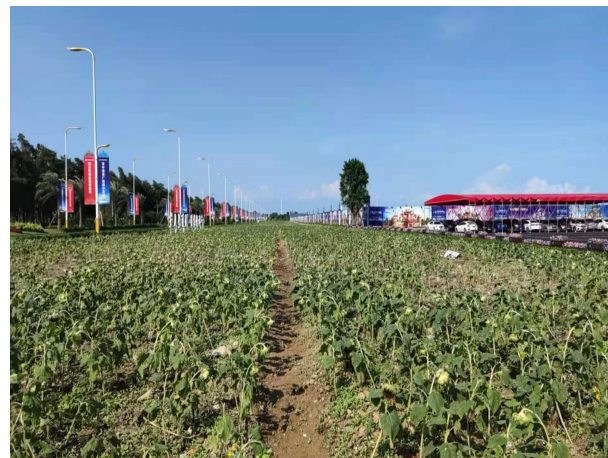

红江路复垦



1 号停车场



销售中心正立面



销售中心侧立面



销售中心内部装修 1



销售中心内部装修 2



销售中心智慧社区



销售中心货量区沙盘



销售中心-总图沙盘



销售中心成交区



商业中心外立面



商业中心侧立面




商业中心内部装修



商业中心内部装修



样板房外立面

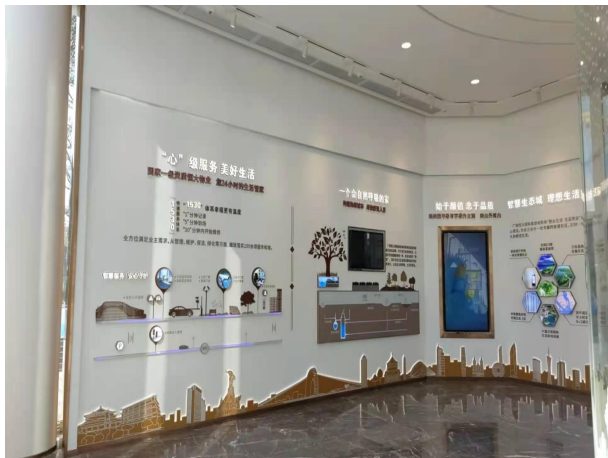

样板房工艺工法



1#栋首层施工



3#栋首层施工



5#栋筏板施工



6#栋筏板施工



8#栋首层施工




9#栋首层施工



11#栋筏板施工



13#栋 7 层施工

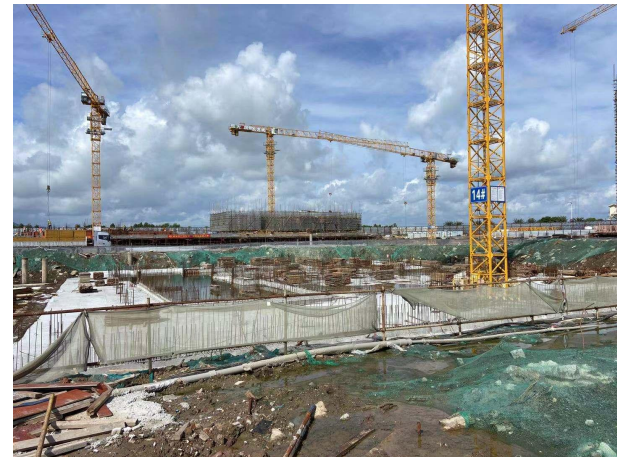

14#栋筏板施工



15#栋基坑施工



16#栋基坑施工



17#栋首层施工



18#栋现貌

附件五：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
请见邮件附件
